

新型コロナウイルス感染症による影響調査  
報告書（第2報）  
～県内建設業界の経済動向～

一般社団法人群馬県建設業協会  
令和2年4月6日

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の世界的な拡大に伴い各地域で移動制限が実施され、株価の暴落や実体経済の急速な落ち込みが続く中、政府において様々な経済対策が検討されています。

そこで、会員企業を対象に、現在の受注工事における影響や今後の見通しについてアンケート調査を実施しました。


調査期間 令和2年3月25日～30日  
調査対象 一般社団法人群馬県建設業協会 本部会員 275社（全社）  
回答社数 242社  
回答率 88%

**【留意事項】**

調査期間もしくは最近まで実施していた工事、また、予定していた工事への影響を調査しており、加えて建築と土木に分けています。該当がない場合を省いているため、母数はその都度変わります。

1. 現在実施中あるいは最近まで実施していた工事での新型コロナウイルスの影響

**【建築】**

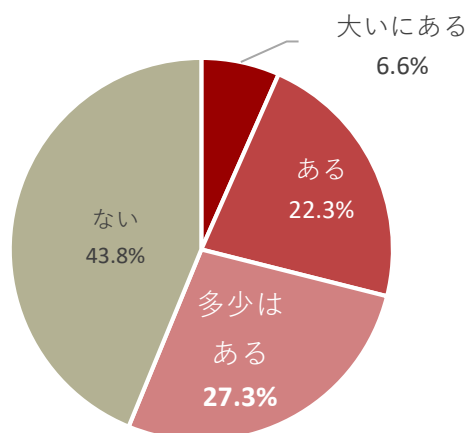


選択肢	選択社数
大いにある	8
ある	27
多少はある	33
ない	53
計	121

※ 該当なし（建築なし）121社を除く。

建築工事を現在実施している企業121社においては、「大いにある」「ある」「多少はある」を含めると56.2%が何らかの影響を受けていることが分かる。

## 【土木】

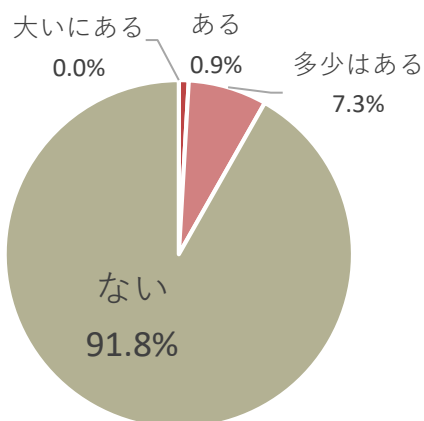

選択肢	選択社数
大いにある	0
ある	2
多少はある	16
ない	201
計	219


※ 該当なし（土木なし）23社を除く。

土木工事の場合、9割以上が「ない」と回答し、影響は軽微であった。

## 2. どのような影響が出ているか

### 【建築】

- ・ 建築で影響が「大いにある」「ある」「多少はある」を選んだ68社の回答（複数回答）中のそれぞれの回答数

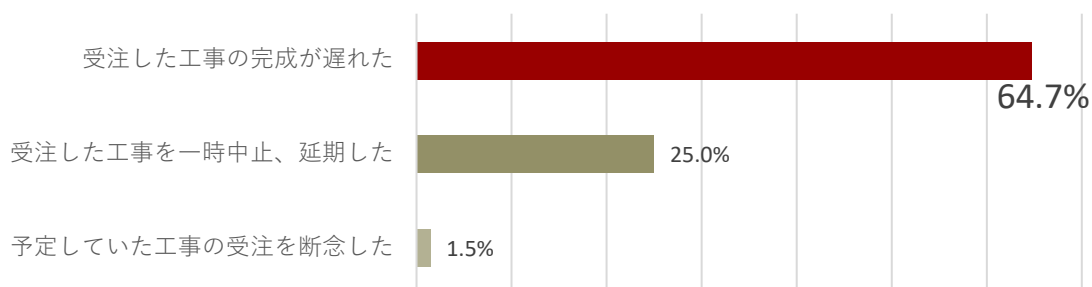


選択肢	選択社数(68社中)
受注した工事の完成が遅れた	44
受注した工事を一時中止、延期した	17
予定していた工事の受注を断念した	1
選択総数	62

※ 選択していない社もある。

影響があった会社の6割以上が「受注した工事の完成が遅れた」を選択しており、当初の工期に間に合わない事例が多かった。

## 【土木】

- 土木で影響が「大いにある」「ある」「多少はある」を選んだ 18 社の回答（複数回答）中のそれぞれの回答数

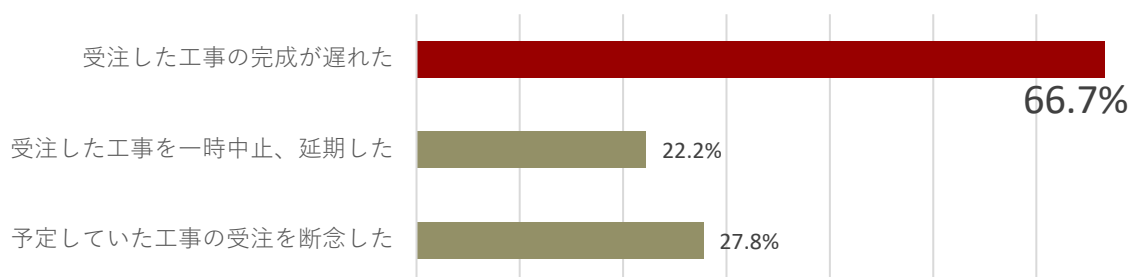


選択肢	選択社数(18社中)
受注した工事の完成が遅れた	12
受注した工事を一時中止、延期した	4
予定していた工事の受注を断念した	5
	選択総数 21

建築と同様「受注した工事の完成が遅れた」と回答した企業が 6 割を超えているが、建築に比べて数は少ない。

### 3. 影響が出た原因は何だと思うか

## 【建築】

- 建築で影響が「大いにある」「ある」「多少はある」を選んだ 68 社の回答（複数回答）中のそれぞれの割合と回答数

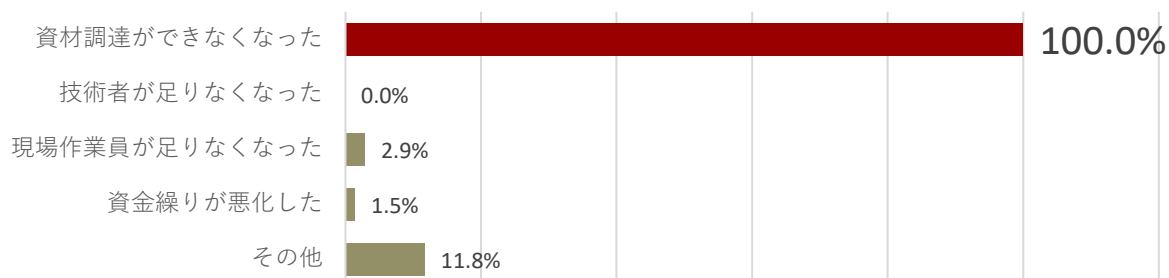

選択肢	選択社数(68社中)
資材調達ができなくなった	68
技術者が足りなくなった	0
現場作業員が足りなくなった	2
資金繰りが悪化した	1
その他	8
	選択総数 79


### その他（抜粋）

- ・ 工事場所のコロナウイルス対策で工事を中止するように指示を受けている
- ・ 発注者と工事一時中止協議にて

建築で影響があったと回答した会社 68 社のうち、全社が「資材調達ができなくなった」選択しており、建築用の資材が逼迫している状況が分かる。

### 【土木】

- ・ 土木で影響が「大いにある」「ある」「多少はある」を選んだ 18 社の回答（複数回答）中のそれぞれの割合と回答数

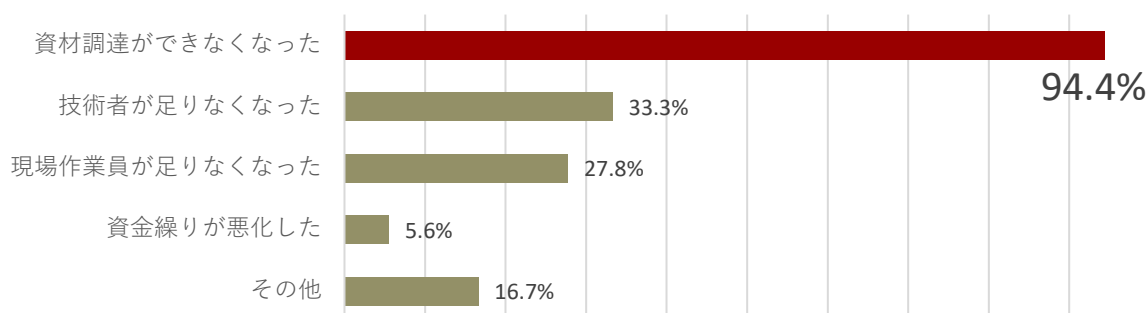

選択肢	選択社数(18社中)
資材調達ができなくなった	17
技術者が足りなくなった	6
現場作業員が足りなくなった	5
資金繰りが悪化した	1
その他	3
	選択総数 32


### その他（抜粋）

- ・ 感染防止のため新規工事一時停止という案件がある。

土木においても建築と同様に「資材調達ができなくなった」が最も選択されているが、建築に比べて数は少ない。

4. 特に民間工事において予定した工事の発注が延期、または中止になったケース

【建築】

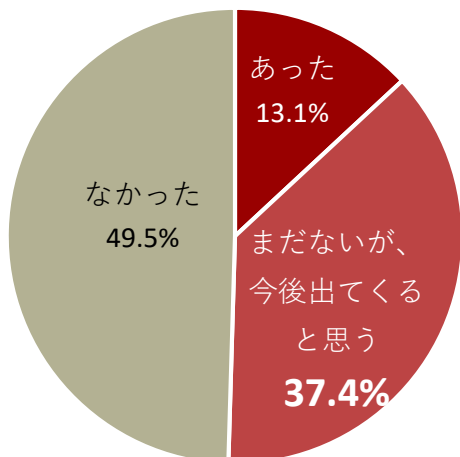


選択肢	選択社数
あった	14
まだないが、今後出てくると思う	40
なかった	53
計	107

※ 該当なし 135 社を除く。

実際にあったケースと今後出てくると予想する回答が5割を超えた。

【土木】

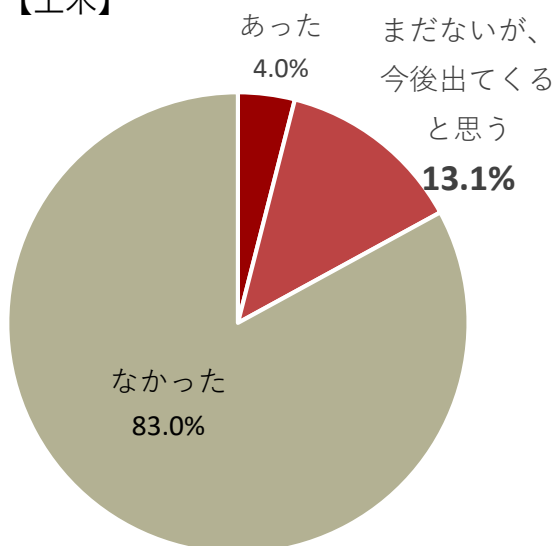

選択肢	選択社数
あった	7
まだないが、今後出てくると思う	23
なかった	146
計	176

※ 割合は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計の表記が必ずしも100.0%とはなりません。


※ 該当なし 66 社を除く。

土木においては「なかった」の回答が8割を超えているが、延期や中止を予想する回答もそれなりにあり、資材不足を土木においても予想していることがうかがえる。

## 5. 延期や一時中止になった原因は何だと思うか

### 【建築】

- ・ 建築で延期や中止になったケースが「あった」「まだないが今後出てくると思う」を選んだ 54 社の回答（複数回答）中のそれぞれの割合と回答数

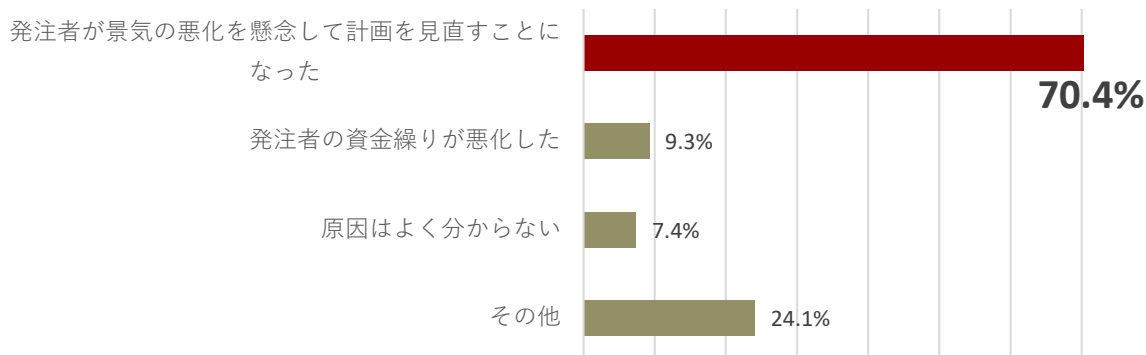

選択肢	選択社数(54社中)
発注者が景気の悪化を懸念して計画を見直すことになった	38
発注者の資金繰りが悪化した	5
原因はよく分からない	4
その他	13
	選択総数 60


### その他（抜粋）

- ・ 資材の調達が出来なくなったから
- ・ 希望の備品や部材等の資材調達の目途が立たない
- ・ 輸入品から国産品へ変更したときの、資金増。

民間工事では、発注者側で計画を見直すケースが回答社数の7割を超え、その他の回答では資材調達が出来ず延期や一時中止を余儀なくされる回答もあった。

### 【土木】

- ・ 土木で延期や中止になったケースが「あった」「まだないが今後出てくると思う」を選んだ 30 社の回答（複数回答）中のそれぞれの割合と回答数

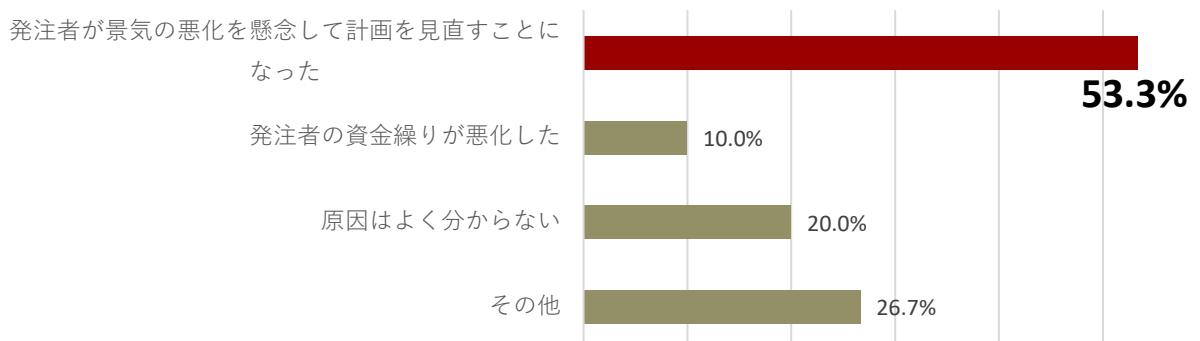

選択肢	選択社数(30社中)
発注者が景気の悪化を懸念して計画を見直すことになった	16
発注者の資金繰りが悪化した	3
原因はよく分からない	6
その他	8
	選択総数 33


#### その他（抜粋）

- ・ 資材の調達に遅れが生じた。
- ・ 新型コロナウイルス感染拡大による直接的な影響と、東京オリンピック・パラリンピックが延期になったことによる、極度の業績悪化が懸念されるため。
- ・ コロナウイルスの感染防止のため。
- ・ 型枠材料（ベニヤ等）の入手に影響

土木の民間工事においては建築と同様に「発注者が景気の悪化を懸念して計画を見直すことになった」が多かったが、数としては少ない。

その他では、新型コロナウイルスの感染者の濃厚接触者が下請で発覚したため2週間休工したという例もあった。

## 6. 会社の働き方の変化

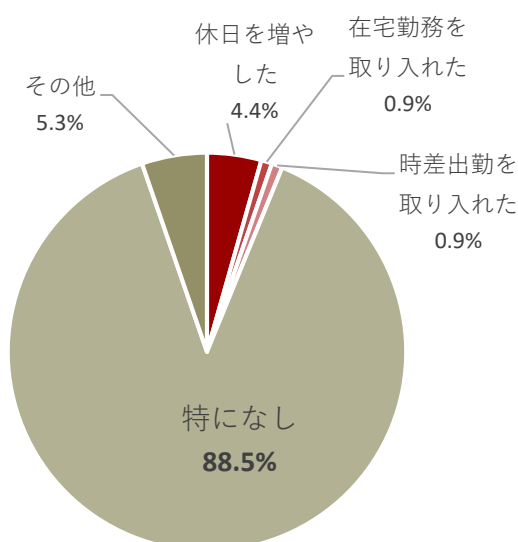

選択肢	選択社数
休日を増やした	10
在宅勤務を取り入れた	2
時差出勤を取り入れた	2
特になし	201
その他	12
計	227

※ 割合は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計の表記が必ずしも100.0%とはなりません。

※ 未回答15社を除く。

#### その他（抜粋）


- ・ 朝礼、定期会議を取りやめた。現場監督は現場に直行・直帰をさせている。
- ・ 出入口の消毒液の設置、各部毎の昼食及び時間差(間隔を空けて昼食を取る)、歓送迎会の自粛。
- ・ 少人数の会社は在宅や時差など実施できない。

- ・ 職員が一同に集まる会合の自粛。
- ・ 子供のいる女性従業員に特別休暇をあたえた。

特になしと回答した企業が8割を超えているが、その他として、会議開催の中止や縮小、現場での消毒の徹底などの回答が目立った。

在宅勤務や時差出勤についてはそれぞれ2社しか選択がなく、建設業においてはなかなか普及が進まない現状が分かる。

## 7. 新型コロナウイルスの広がりやその対策による公共事業への影響予測

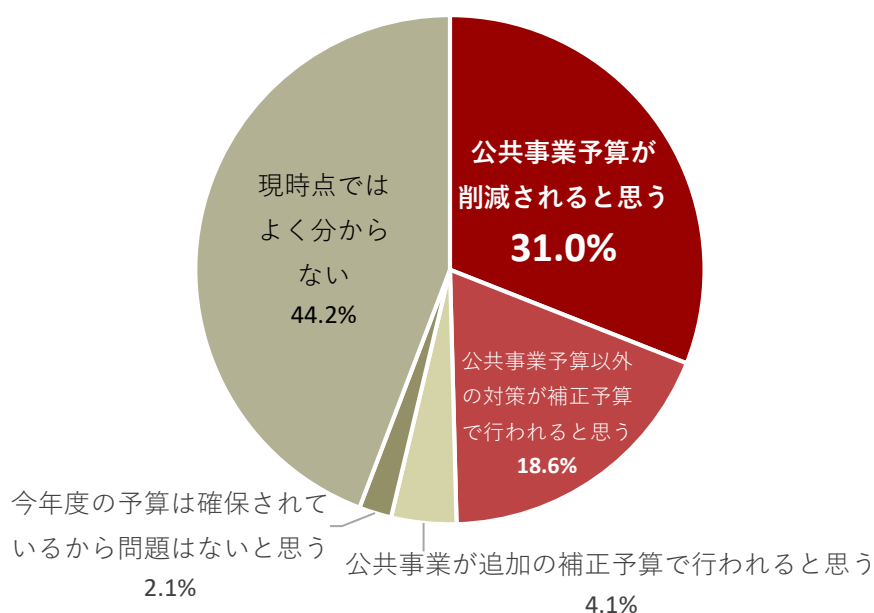


選択肢	選択社数
新型コロナウイルス感染症対策のために公共事業予算が削減されると思う	75
景気対策のために公共事業以外の対策が補正予算で行われると思う	45
景気対策のための公共事業が追加の補正予算で行われると思う	10
今年度の予算は確保されているから問題はないと思う	5
現時点ではよく分からない	107
計	242

公共事業予算が削減される、もしくは景気対策のための補正予算は公共事業以外で行われると予想する企業が約5割となった。



8. 今後2, 3カ月先を考えた場合の会社の売上高の予想

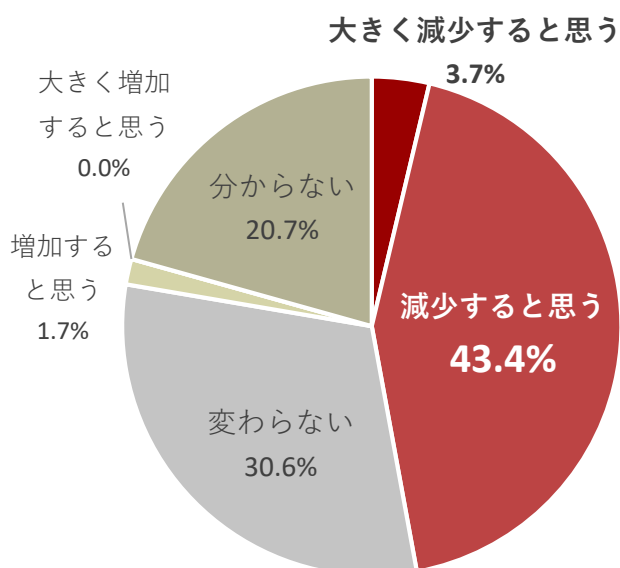

選択肢	選択社数
大きく減少すると思う	9
減少すると思う	105
変わらない	74
増加すると思う	4
大きく増加すると思う	0
分らない	50
計	242

※ 割合は小数点以下第2位を四捨五入しているため、合計の表記が必ずしも100.0%とはなりません。

会社の売り上げの予想では、47%が減少を予想している。景気の悪化や資材調達ができないことによる民間建築工事の減少と、公共事業の減少を予想する企業が多いため、このような結果になったと思われる。
